



Project Parallel Boulevard aanpak in 4 deelprojecten

Zoom meeting met klankbordgroepen

28 oktober 2020





Inhoud presentatie

1. Achtergrond fasering
2. Nieuwe planning
3. Drain Parallel Boulevard in aanbestedingsfase
4. Aangepast BLVC – kader
5. Afstemming communicatiebehoefte
6. Vragen
7. Herinrichting parkeerterrein Palaceplein






Achtergrond fasering

- Bestuurlijke prioriteit parkeerdruk
- Palaceplein nodig voor parkeren tijdens aanleg drain en gelijktijdige bouwprojecten
- Winterplanning sluit aan bij wens horeca, retail en evenementen
- Stikstofdepositie per fase acceptabel




Nieuwe planning

Deelproject	Periode uitvoering
1. Herinrichting parkeerterrein Palaceplein	1 september 2020 – 1 maart 2021
2. Aanleg drain en herinrichting Parallel Boulevard	15 sept 2021 – 1 april 2022 & 15 sept 2022 – 1 april 2023 Uitloop naar 1 mei bij tegenvallers
3. Herinrichting De Grent	Na afronding Parallel Boulevard, buiten maanden mei t/m augustus
4. Aanleg rotonde Vuurtorenplein /deel Wantveld	Na afronding Parallel Boulevard, buiten maanden mei t/m augustus




Aanbestedingsfase

- Aanleg drain + herinrichting PB nu in aanbestedingsfase
- Gunning in februari 2021, start uitvoering medio september 2021

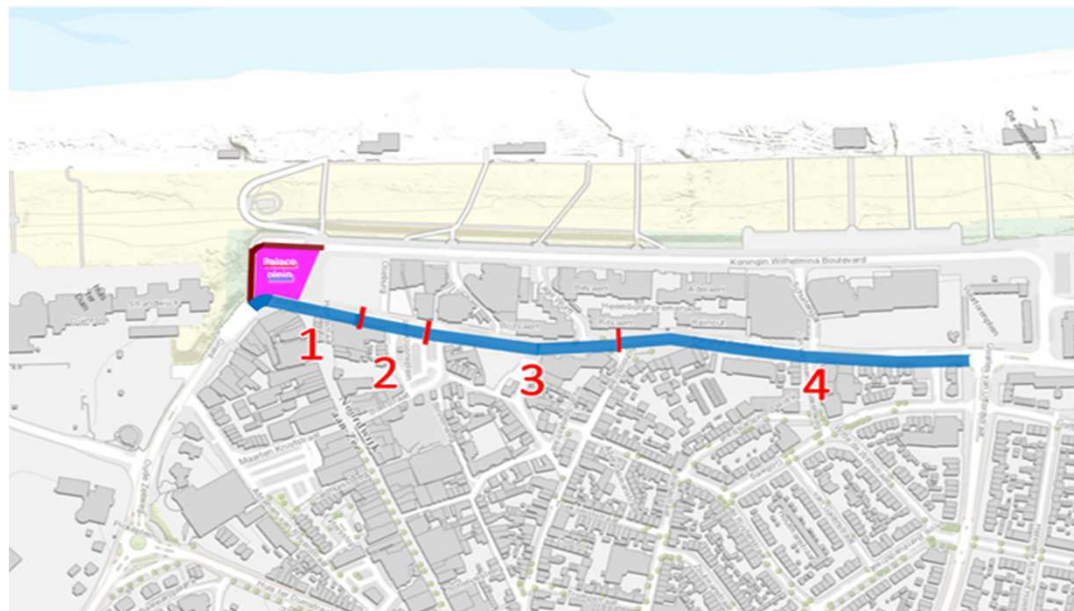




BLVC kader: zone 1

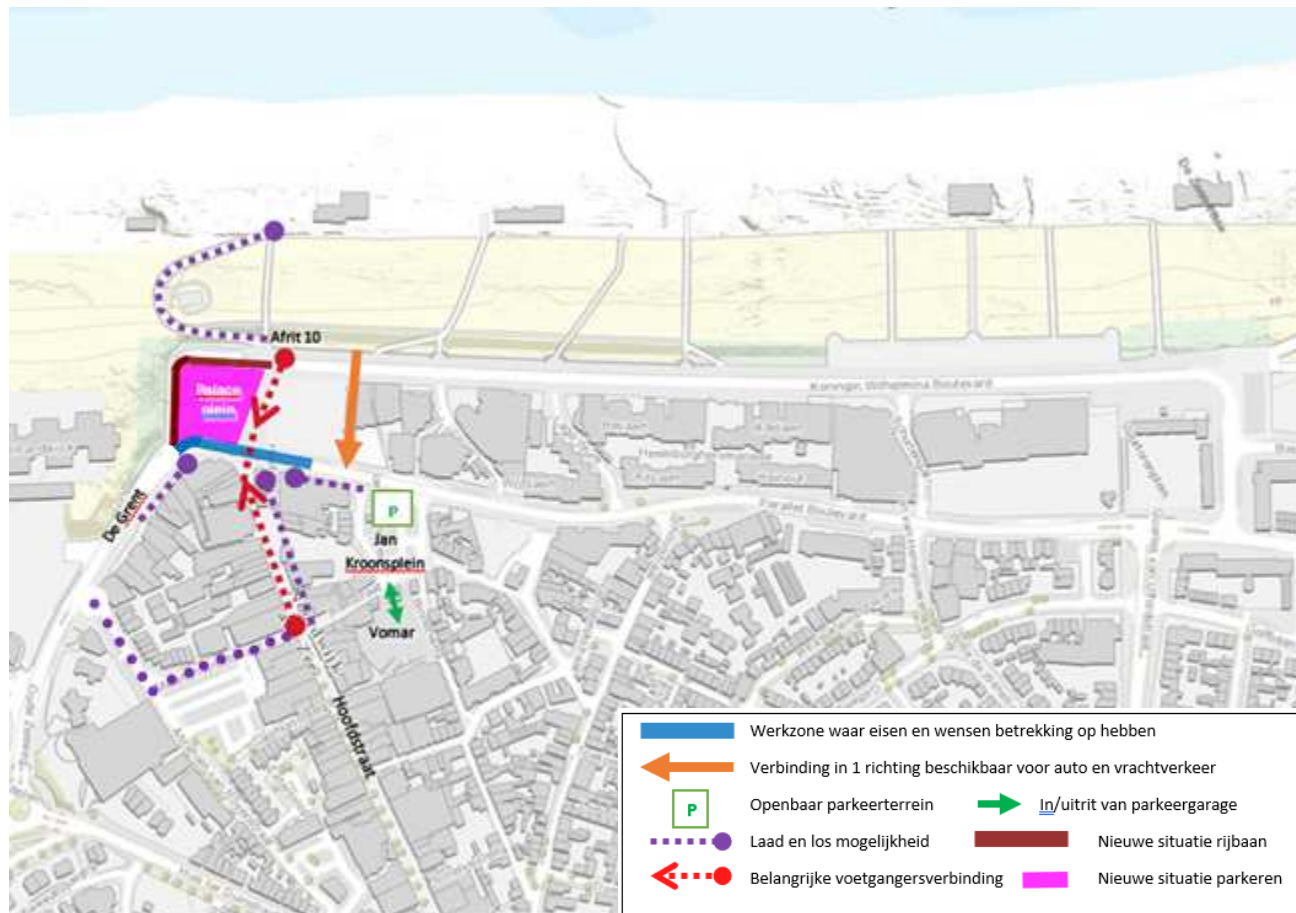




BLVC kader: zone 2

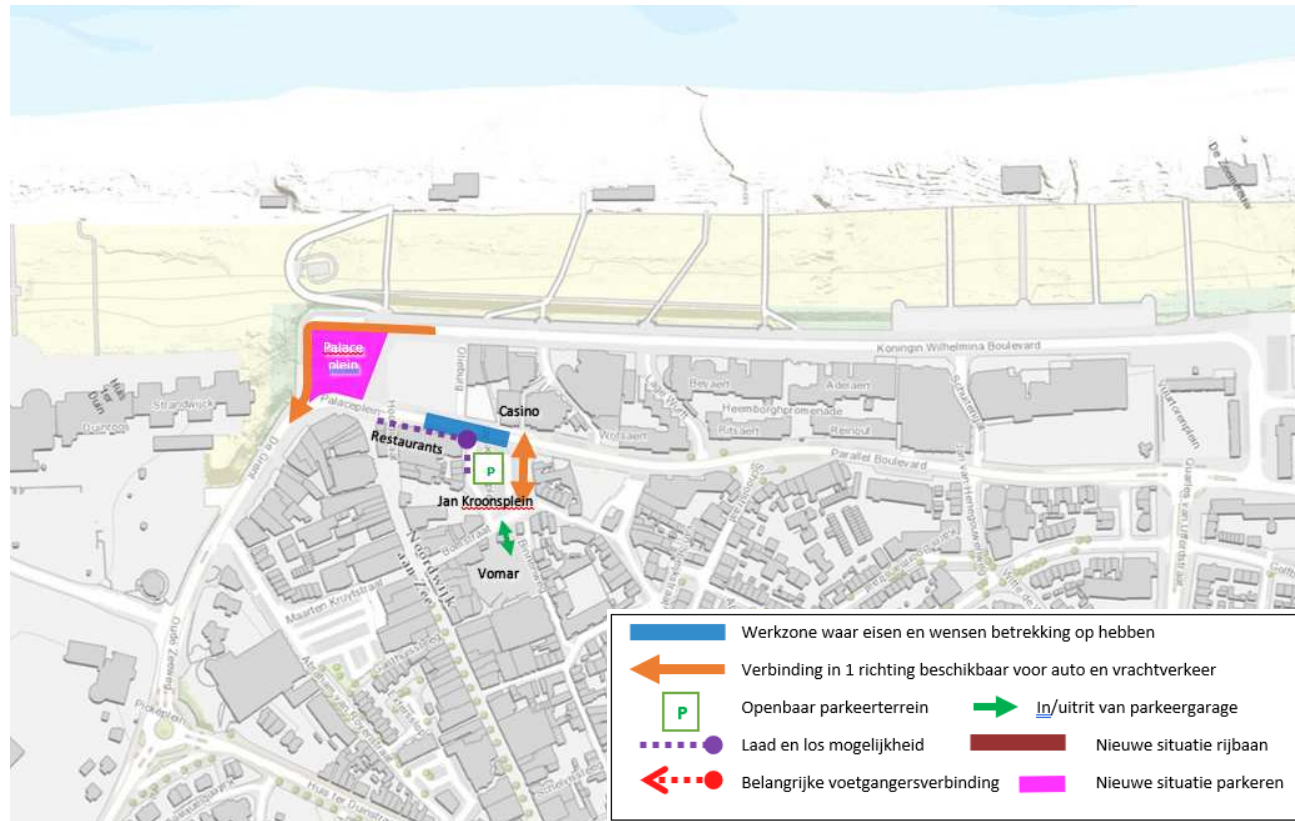




BLVC kader: zone 3

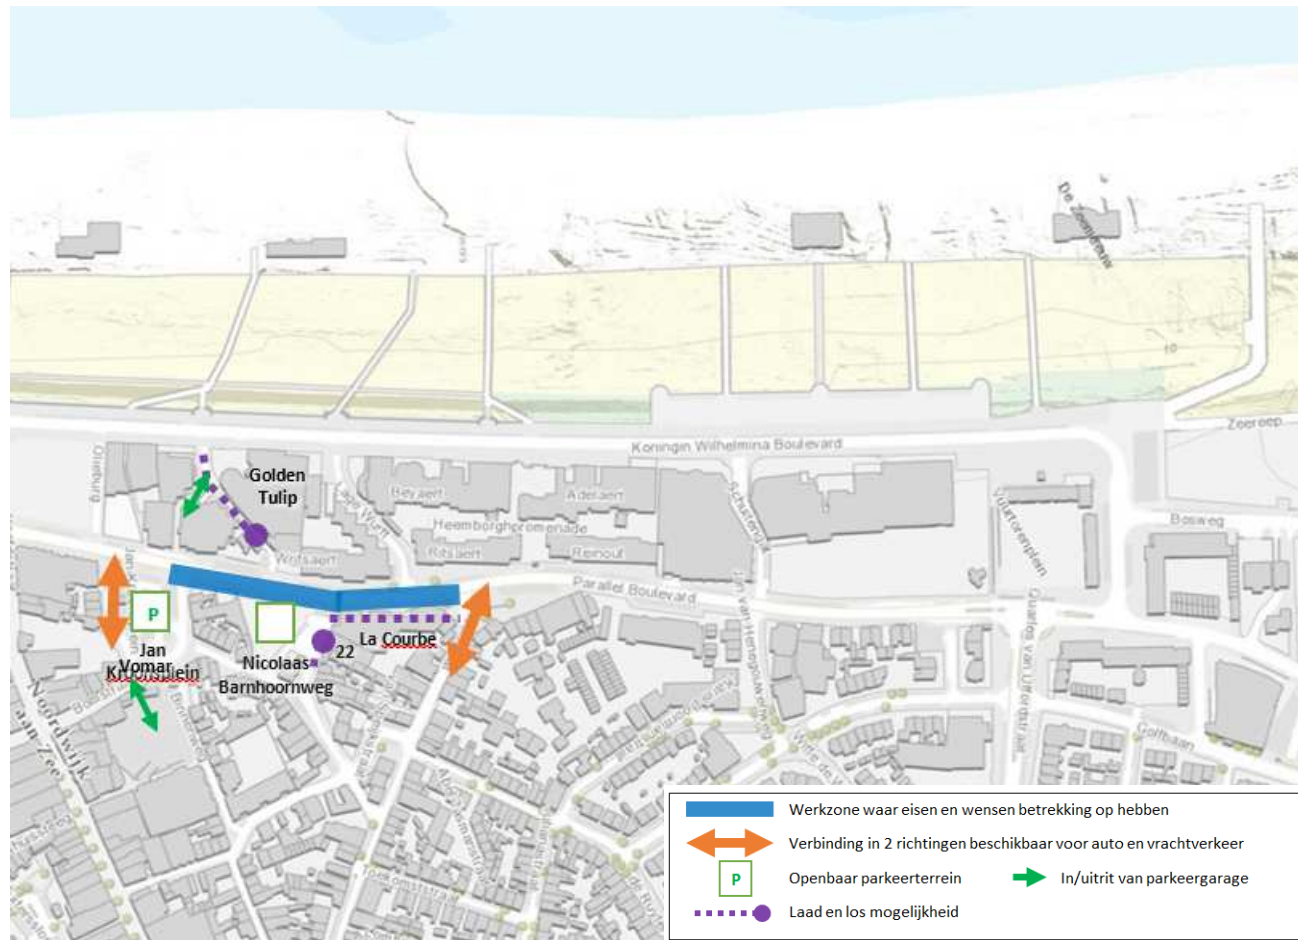



BLVC kader: zone 4

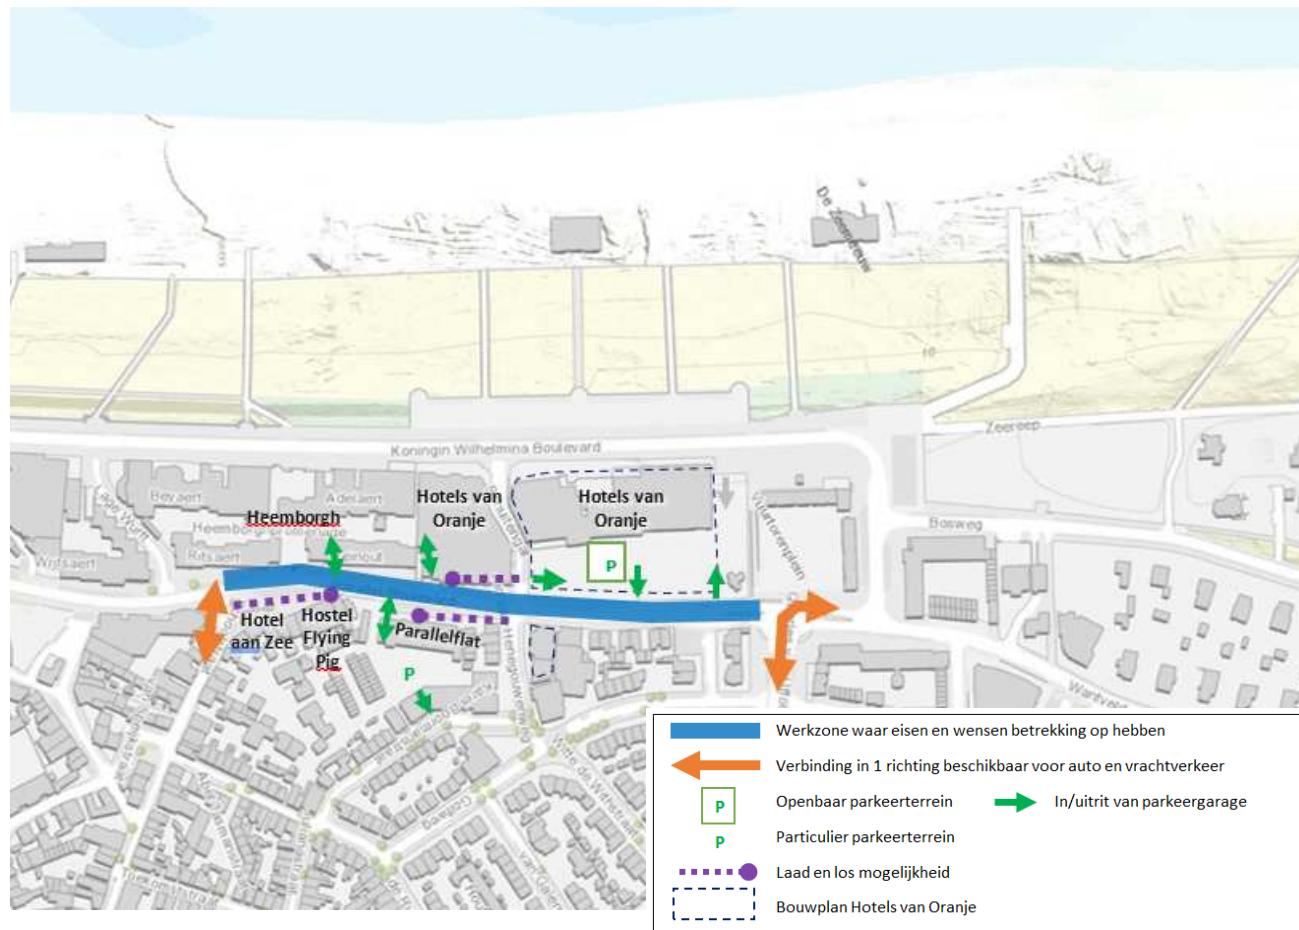



Afstemming communicatiebehoefte


1. Welke informatie?
2. Welke frequentie?
3. Functie klankbordgroep?





Vragen?

Contact via info@parallelboulevard.nl



Meer informatie

Nieuwsbrief en aangepaste projectwebsite

www.parallelboulevard.nl



Stand van zaken parkeerterrein Palaceplein





Stand van zaken parkeerterrein Palaceplein

<https://youtu.be/y42p6m-NnDo>

